

La capacità di spesa nel Comune di Rieti sulle Politiche di Coesione



Rieti, 31 marzo 2022

La capacità di spesa nel Comune di Rieti: Ciclo di programmazione dei Fondi coesione 2014-2020

- Interventi previsti su Rieti
- Confronto con gli altri comuni capoluogo della regione
- Focus e differenze per area tematica nel territorio
- Analisi delle criticità:
 - ✓ Dimensione media dei progetti
 - ✓ Stato dei progetti
 - ✓ Tempi di attraversamento delle fasi

Le analisi svolte sono il frutto di informazioni ed elaborazioni su dati tratti dal sito istituzionale www.opencoesione.it

«OpenCoesione è l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia. Sul portale sono navigabili dati su risorse programmate e spese, localizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei singoli progetti.


Tutti possono così valutare come le risorse vengono utilizzate rispetto ai bisogni dei territori»

Fonte: *elaborazioni RiData su dati OpenCoesione <https://opencoesione.gov.it/it/>*
Aggiornamento: *31 dicembre 2021*

Puglisi, Rizzo, Secomandi - fig.1

By Associazione lavoce on 8 Jun 2021


Figura 1 - Percentuale di pagamenti su fondi pubblici impiegati per progetti Fse, limitatamente ai progetti per cui i comuni sono gli attuatori, periodo 2014-2020

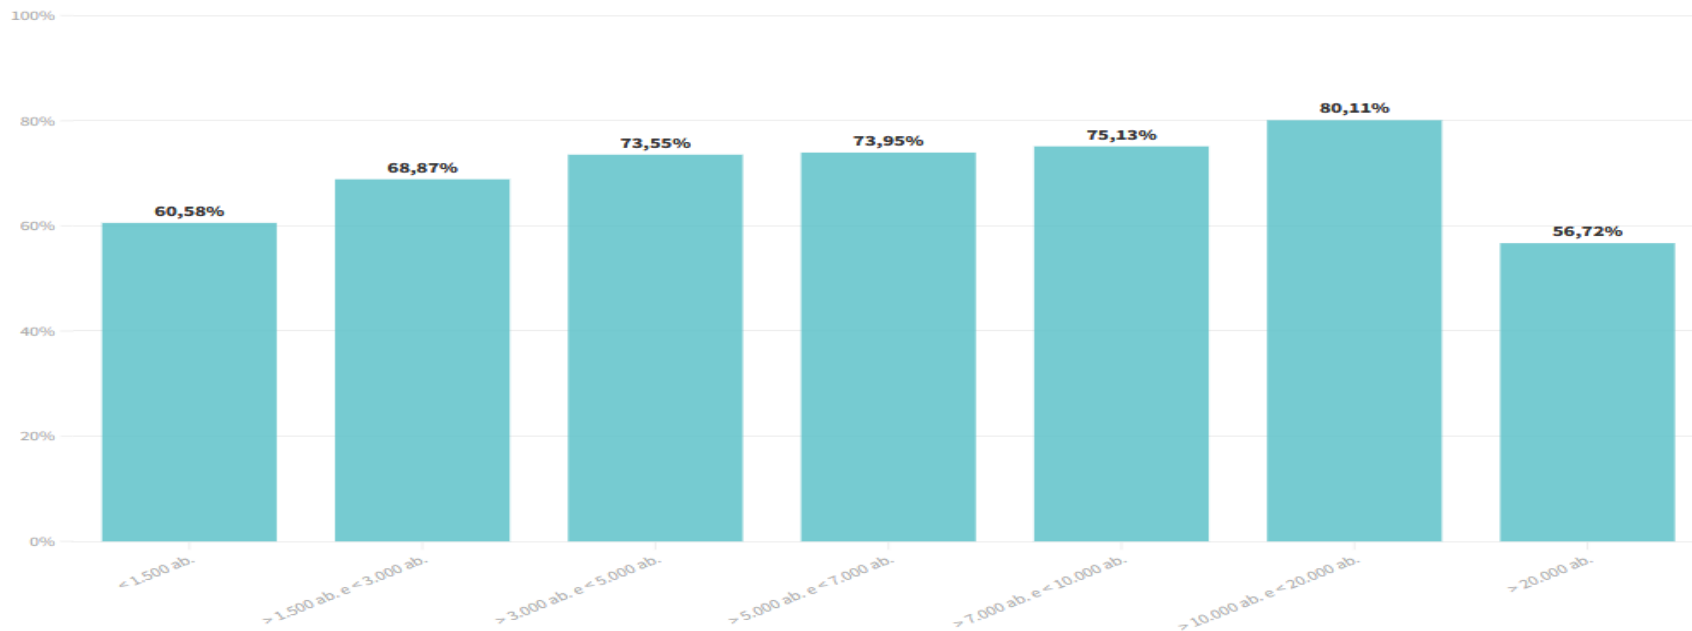

Fonte: [Opencoesione.gov](https://opencoesione.gov.it/)

lavoce.info

Figura 2 – Percentuale di pagamenti su fondi pubblici impiegati per progetti Fse che hanno visto come attuatori e realizzatori i comuni, periodo 2014-2020

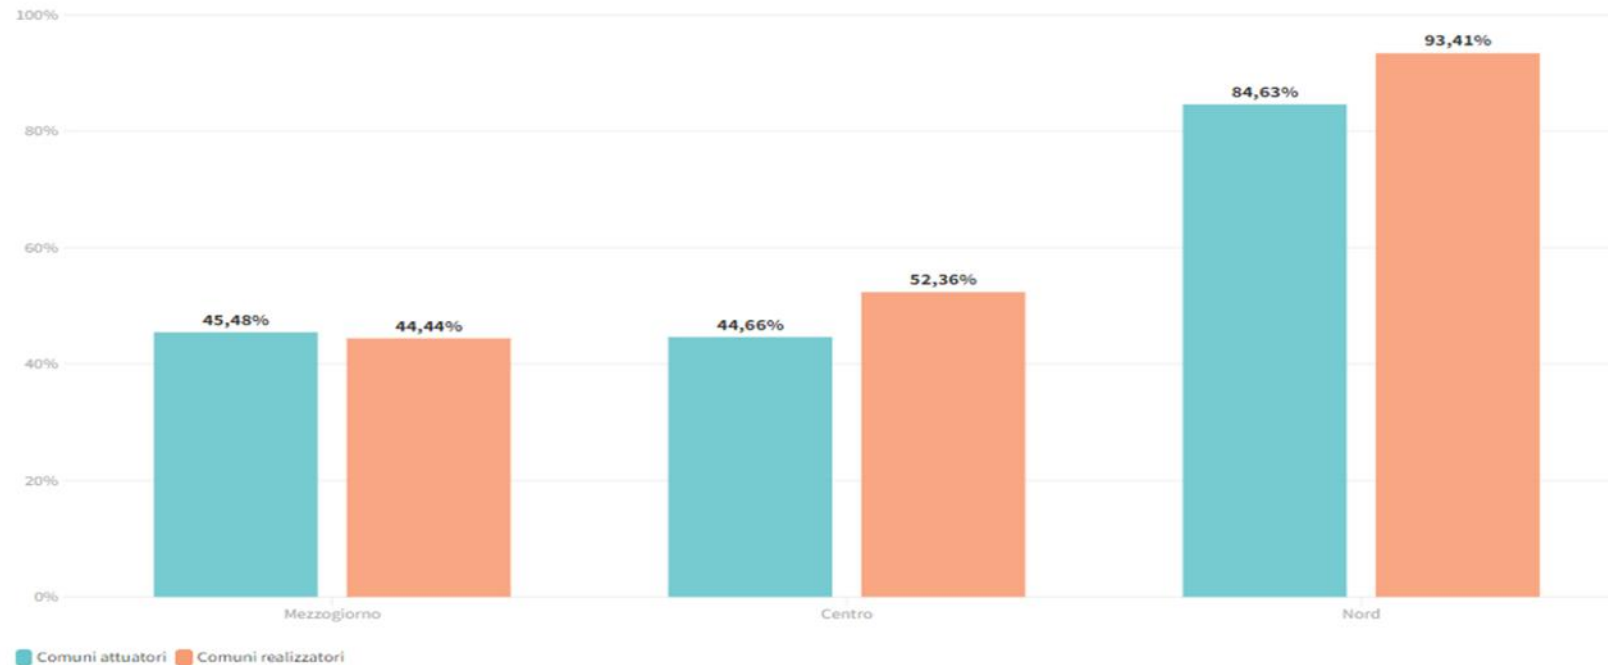

Fonte: opencoesione.it

lavoce.info

Cicli di programmazione

programmazione

Ciclo 2007-2013

Ciclo 2014 - 2020

In quali settori si interviene

TEMI

- Agenda digitale
- Ambiente e prevenzione dei rischi
- Attrazione culturale, naturale e turistica
- Competitività per le imprese
- Energia e efficienza energetica
- Inclusione sociale
- Infanzia e anziani
- Istruzione
- Occupazione e mobilità dei lavoratori
- Rafforzamento capacità della PA
- Ricerca e innovazione
- Rinnovamento urbano e rurale
- Trasporti e infrastrutture a rete


Cosa fare

NATURA

- Acquisto beni e servizi
- Infrastrutture
- Incentivi alle imprese
- Contributi a persone
- Conferimenti capitale

La spesa pro capite nelle Province della Regione Lazio

ciclo di programmazione 2014-2020

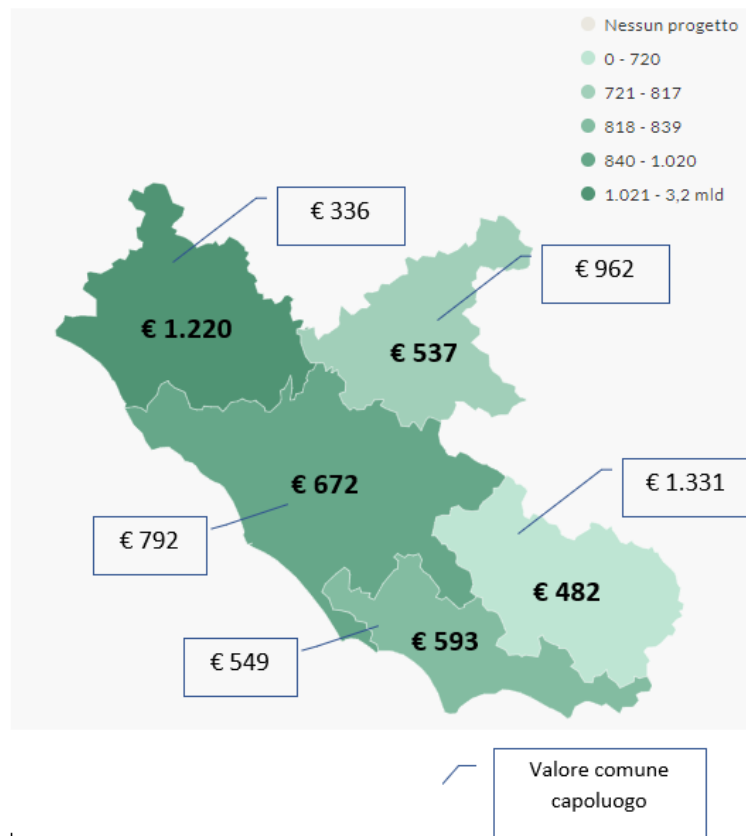

L'analisi dei progetti monitorati rende possibile focalizzare l'attenzione su 3 figure principali che a vario titolo intervengono nell'ideazione, verifica e realizzazione degli stessi.

Alla realizzazione dei Progetti partecipano in linea principale tre figure:

è il soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto: si tratta generalmente di un'amministrazione pubblica centrale o regionale.

Il programmatore


è il responsabile dell'attuazione del progetto, responsabilità affidata dal programmatore e che può controllare i realizzatori, solitamente un'amministrazione pubblica centrale o locale.

l'attuatore

è il soggetto che realizza effettivamente il progetto. Nel caso di opere e lavori pubblici coincide con il titolare del contratto di appalto che esegue materialmente l'opera. Analogamente per un progetto di acquisto di beni o servizi, il realizzatore è individuabile con il titolare del contratto di appalto chiamato a fornire i beni o a erogare il servizio.

il realizzatore

I programmi monitorati nel territorio del Comune di Rieti

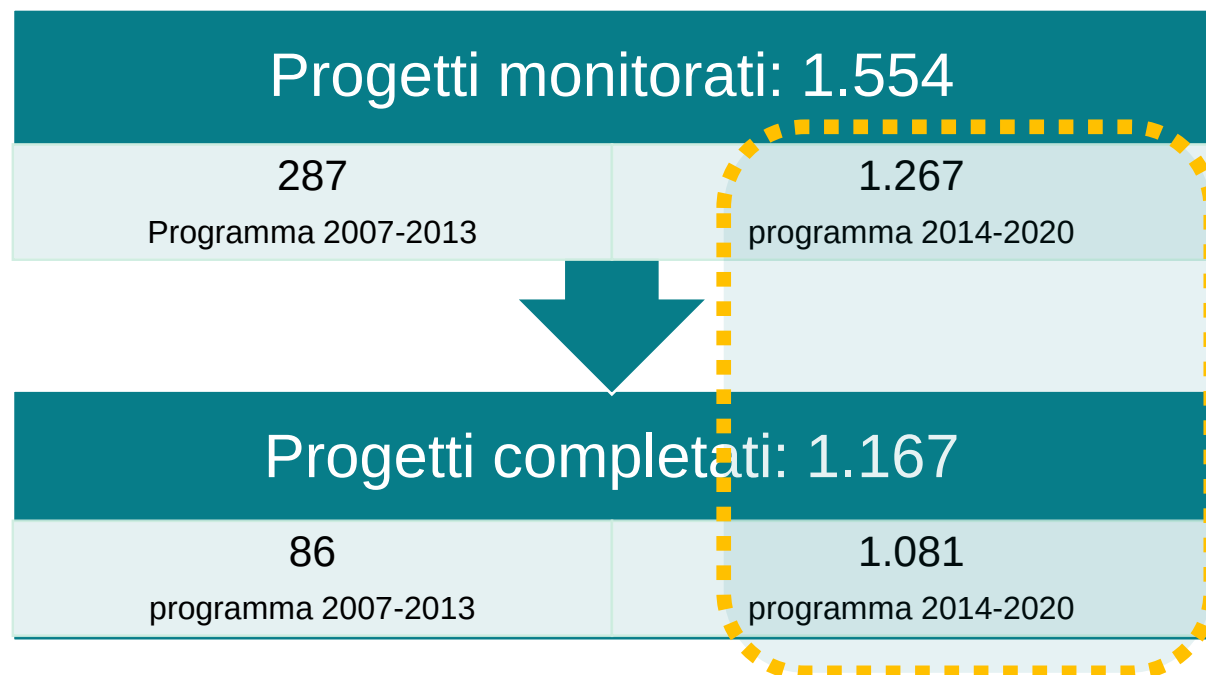

I programmi del secondo ciclo di programmazione

Gli obiettivi tematici



I programmi del secondo ciclo di programmazione: Obiettivi e ambiti

Obiettivi	Ambiti	Progetti
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	Istruzione	1
	Occupazione e mobilità dei lavoratori	1.086
	Totale	1.087
Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente	Agenda digitale	29
	Istruzione	64
	Totale	93
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	Inclusione sociale	32
	Totale	32
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)	Agenda digitale	13
	Competitività per le imprese	11
	Totale	24
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	Ambiente e prevenzione dei rischi	1
	Competitività per le imprese	1
	Ricerca e innovazione	6
	Totale	8

In sintesi i due cicli di programmazione nel territorio del Comune di Rieti

- 287 progetti
- 25 mln €
investimento totale
- 88 k€
investimento medio

ciclo di programmazione
2007-2013

- 1.267 progetti
- 30 mln €
investimento totale
- 24 k€
investimento medio

ciclo di programmazione
2014-2020

- 1.554 progetti
- 56 mln €
investimento totale
- 36 k€
investimento medio

ciclo di programmazione
2007-2013

ciclo di programmazione
2014-2020

I programmi monitorati nel territorio del Comune di Rieti

negli ambiti di intervento

AMBITO	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	Importo totale	valore medio
Agenda digitale	49	3%	2.610.785,17 €	53.281,33 €
Ambiente e prevenzione dei rischi	6	0%	3.881.438,71 €	646.906,45 €
Attrazione culturale, naturale e turistica	2	0%	1.026.405,99 €	513.203,00 €
Competitività per le imprese	58	4%	2.248.963,59 €	38.775,23 €
Energia e efficienza energetica	12	1%	3.990.099,66 €	332.508,31 €
Inclusione sociale	43	3%	8.054.836,54 €	187.321,78 €
Istruzione	177	11%	7.473.691,43 €	42.224,25 €
Occupazione e mobilità dei lavoratori	1.158	75%	8.898.579,70 €	7.684,44 €
Rafforzamento capacità della PA	14	1%	259.377,30 €	18.526,95 €
Ricerca e innovazione	29	2%	9.209.443,53 €	317.567,02 €
Rinnovamento urbano e rurale	4	0%	6.682.815,27 €	1.670.703,82 €
Trasporti e infrastrutture a rete	2	0%	1.300.667,35 €	650.333,68 €
Totale complessivo	1.554	100%	55.637.104,24 €	35.802,51 €

I programmi monitorati nel territorio del Comune di Rieti


ciclo di programmazione 2014-2020

AMBITO	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	Importo totale	valore medio
Agenda digitale	42	3%	922.549,39 €	21.965,46 €
Ambiente e prevenzione dei rischi	5	0%	3.880.126,02 €	776.025,20 €
Attrazione culturale, naturale e turistica	1	0%	646.788,00 €	646.788,00 €
Competitività per le imprese	21	2%	1.607.870,52 €	76.565,26 €
Energia e efficienza energetica	1	0%	699.660,00 €	699.660,00 €
Inclusione sociale	36	3%	7.826.501,34 €	217.402,82 €
Istruzione	68	5%	2.776.146,48 €	40.825,68 €
Occupazione e mobilità dei lavoratori	1.086	86%	4.745.800,84 €	4.369,98 €
Ricerca e innovazione	6	0%	6.621.885,11 €	1.103.647,52 €
Trasporti e infrastrutture a rete	1	0%	502.000,00 €	502.000,00 €
Totale complessivo	1.267	100%	30.229.327,70 €	23.858,98 €


I programmi monitorati nel territorio del Comune di Rieti

ciclo di programmazione 2014-2020


Progetti monitorati

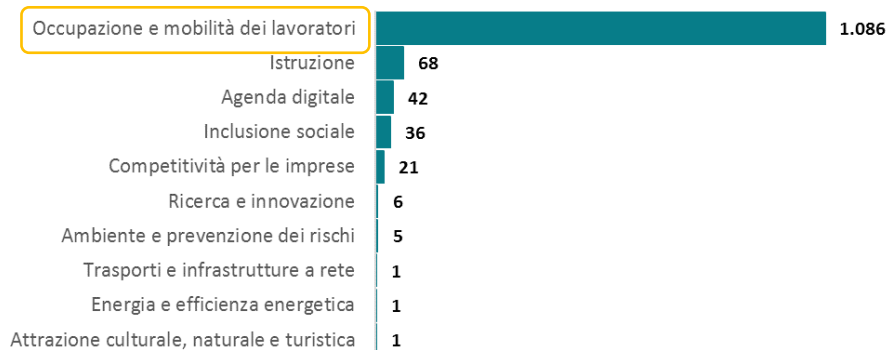

Finanziamento pubblico: importo totale

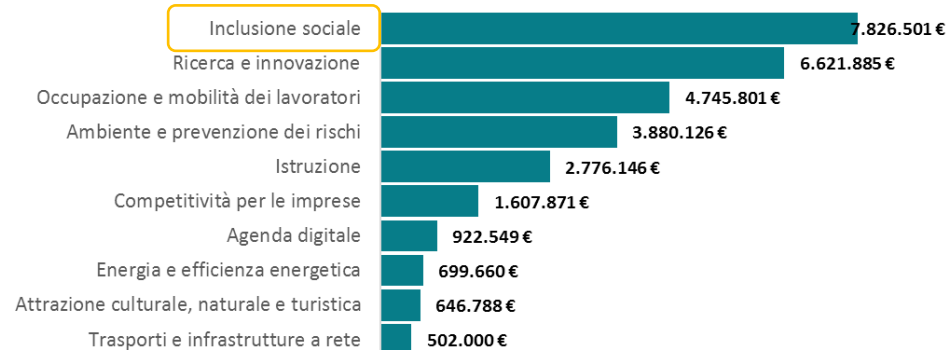

Finanziamento pubblico: importo medio

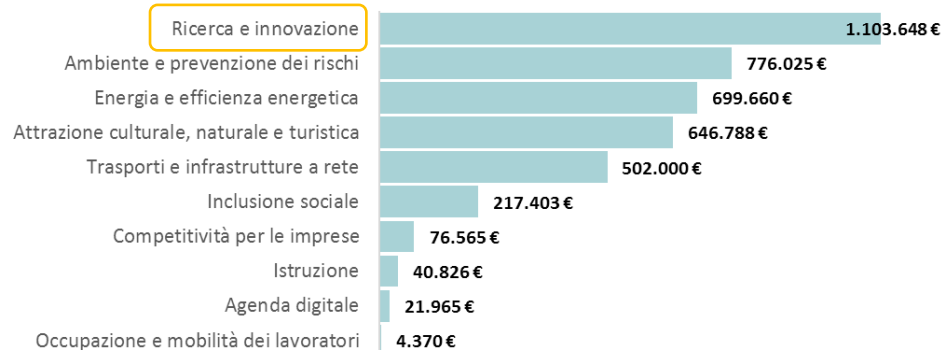

I programmi conclusi nel territorio del Comune di Rieti

ciclo di programmazione 2014-2020

AMBITO	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	Importo totale	valore medio
Agenda digitale	42	4%	922.549,39 €	21.965,46 €
Ambiente e prevenzione dei rischi	1	0%	339.102,02 €	339.102,02 €
Attrazione culturale, naturale e turistica	-			
Competitività per le imprese	9	1%	1.023.212,58 €	113.690,29 €
Energia e efficienza energetica	-			
Inclusione sociale	11	1%	455.874,40 €	41.443,13 €
Istruzione	45	4%	2.060.680,61 €	45.792,90 €
Occupazione e mobilità dei lavoratori	968	90%	3.429.694,03 €	3.543,07 €
Ricerca e innovazione	4	0%	1.126.938,48 €	281.734,62 €
Trasporti e infrastrutture a rete	1	0%	502.000,00 €	502.000,00 €
Totale complessivo	1.081	100%	9.860.051,51 €	9.121,23 €

I programmi conclusi nel territorio del Comune di Rieti

ciclo di programmazione 2014-2020 -

> 50%



85,3%



< 50%




Agenda digitale	 100%	Competitività per le imprese	 42,9%
Trasporti e infrastrutture a rete	 100%	Inclusione sociale	 30,6%
Occupazione e mobilità dei lavoratori	 89,1%	Ambiente e prevenzione dei rischi	 20%
Ricerca e innovazione	 66,7	Attrazione culturale, naturale e turistica	 0%
Istruzione	 66,2	Energia e efficienza energetica	 0%

Progetti monitorati per ambito nei comuni capoluogo del Lazio


AMBITO	Rieti		Frosinone		Latina		Viterbo	
Agenda digitale	49	(3,15%)	68	(3,56%)	72	(2,18%)	48	(3,42%)
Ambiente e prevenzione dei rischi	6	(0,39%)	5	(0,26%)	2	(0,06%)	1	(0,07%)
Attrazione culturale, naturale e turistica	2	(0,13%)	1	(0,05%)		(0,00%)	2	(0,14%)
Competitività per le imprese	58	(3,73%)	13	(0,68%)	23	(0,70%)	42	(3,00%)
Energia e efficienza energetica	12	(0,77%)	9	(0,47%)	9	(0,27%)	10	(0,71%)
Inclusione sociale	43	(2,77%)	84	(4,40%)	86	(2,60%)	87	(6,21%)
Istruzione	177	(11,39%)	180	(9,42%)	267	(8,08%)	162	(11,55%)
Occupazione e mobilità dei lavoratori	1.158	(74,52%)	1.511	(79,07%)	2.817	(85,26%)	1.006	(71,75%)
Rafforzamento capacità della PA	14	(0,90%)	4	(0,21%)	2	(0,06%)	6	(0,43%)
Ricerca e innovazione	29	(1,87%)	30	(1,57%)	17	(0,51%)	26	(1,85%)
Rinnovo urbano e rurale	4	(0,26%)	5	(0,26%)	6	(0,18%)	10	(0,71%)
Trasporti e infrastrutture a rete	2	(0,13%)	1	(0,05%)	3	(0,09%)	2	(0,14%)
Totale complessivo	1.554	100%	1.911	100%	3.304	100%	1.402	100%


Stato dei progetti - ciclo di programmazione 2014-2020

Stato procedurale

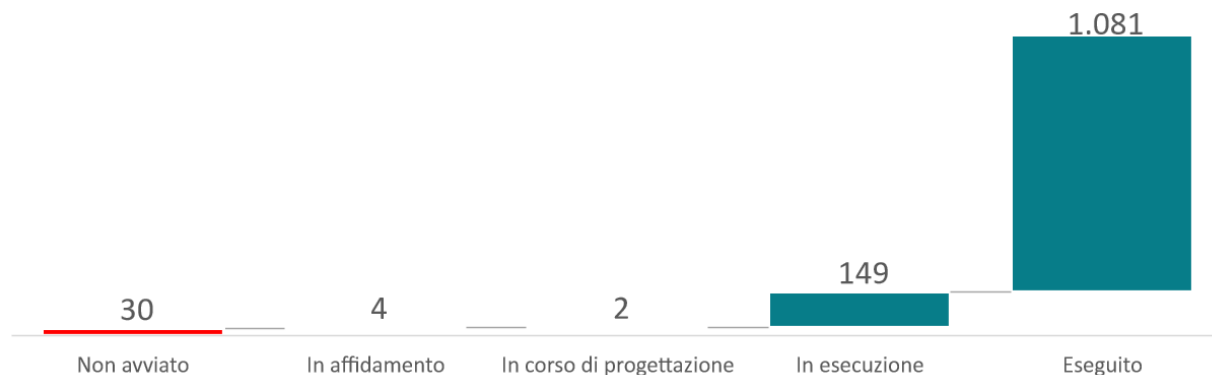

Stato finanziario

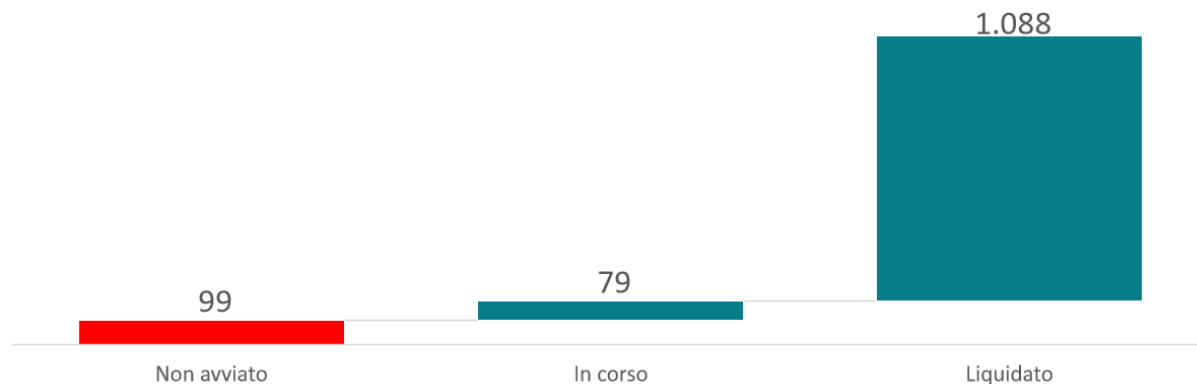

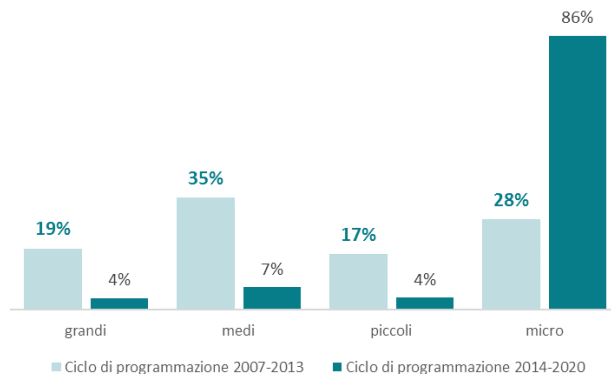


Dimensione dei progetti

		Progetti		Finanziamento Pubblico		
		n.	%	Importo totale	valore massimo	valore medio
Ciclo di programmazione 2007-2013		287		25.407.776,54 €	3.248.802,26 €	88.528,84 €
grandi	(> 100.000€)	55	(19%)	20.018.608,87 €	3.248.802,26 €	363.974,71 €
medi	(20.000 € - 100.000 €)	101	(35%)	4.250.770,37 €	96.610,00 €	42.086,84 €
piccoli	(11.000 € - 20.000 €)	50	(17%)	754.486,26 €	19.902,00 €	15.089,73 €
micro	(< 10.000€)	81	(28%)	383.911,04 €	10.000,00 €	4.739,64 €
Ciclo di programmazione 2014-2020		1.267		30.229.327,70 €	5.293.565,63 €	23.858,98 €
grandi	(> 100.000€)	45	(4%)	22.528.577,94 €	5.293.565,63 €	500.635,07 €
medi	(20.000 € - 100.000 €)	89	(7%)	4.109.249,86 €	99.840,00 €	46.171,35 €
piccoli	(10.000 € - 20.000 €)	48	(4%)	683.846,04 €	19.999,90 €	14.246,79 €
micro	(< 10.000€)	1085	(86%)	2.907.653,86 €	10.000,00 €	2.679,87 €
Totale		1.554		55.637.104,24 €	5.293.565,63 €	35.802,51 €


Dimensione dei progetti ciclo di programmazione 2014-2020

Dimensione (per fascia di finanziamento)		Progetti (n)	Finanziamento Pubblico	valore max	valore medio
grandi	(> 100.000€)	45	22.528.577,94 €	5.293.565,63 €	500.635,07 €
medi	(20.000 € - 100.000 €)	89	4.109.249,86 €	99.840,00 €	46.171,35 €
piccoli	(10.000 € - 20.000 €)	48	683.846,04 €	19.999,90 €	14.246,79 €
micro	(< 10.000€)	1.085	2.907.653,86 €	10.000,00 €	2.679,87 €
Totale		1.267	30.229.327,70 €	5.293.565,63 €	23.858,98 €

num di progetti

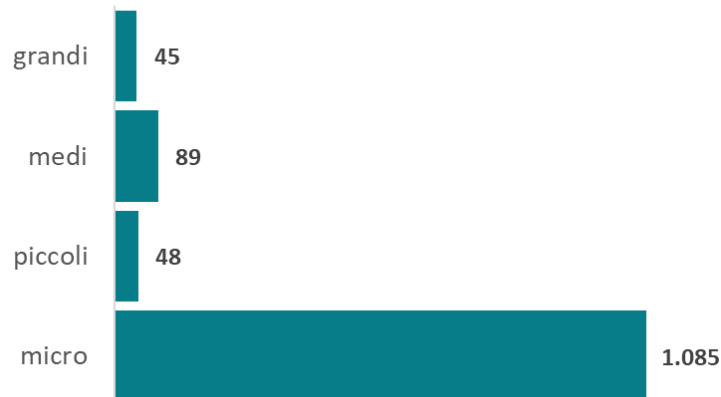

valore medio

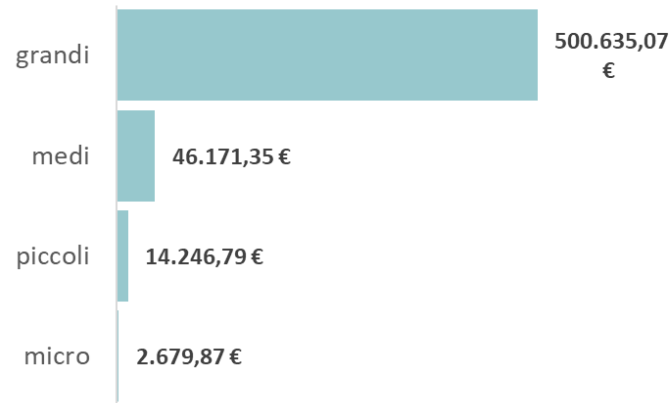

Focus sui «grandi» interventi

Ciclo di programmazione 2014-2020: Finanziamento dei 45 "grandi" progetti

€ 6.000.000,00

AMBITO

Progetti

**Finanziamento
Pubblico**

Agenda digitale	1	150.000,00 €
Ambiente e prevenzione dei rischi	5	3.880.126,02 €
Attrazione culturale, naturale e turistica	1	646.788,00 €
Competitività per le imprese	6	952.316,60 €
Energia e efficienza energetica	1	699.660,00 €
Inclusione sociale	10	6.549.670,52 €
Istruzione	6	998.946,93 €
Occupazione e mobilità dei lavoratori	8	1.527.184,76 €
Ricerca e innovazione	6	6.621.885,11 €
Trasporti e infrastrutture a rete	1	502.000,00 €

Totale

45

22.528.577,94 €

Ricerca e innovazione; €
5.293.565,63


Inclusione sociale; €
5.145.079,54

Ambiente e prevenzione dei
rischi; € 1.200.000,00


Ambiente e
prevenzione dei...

€ 1.000.000,00

€ -

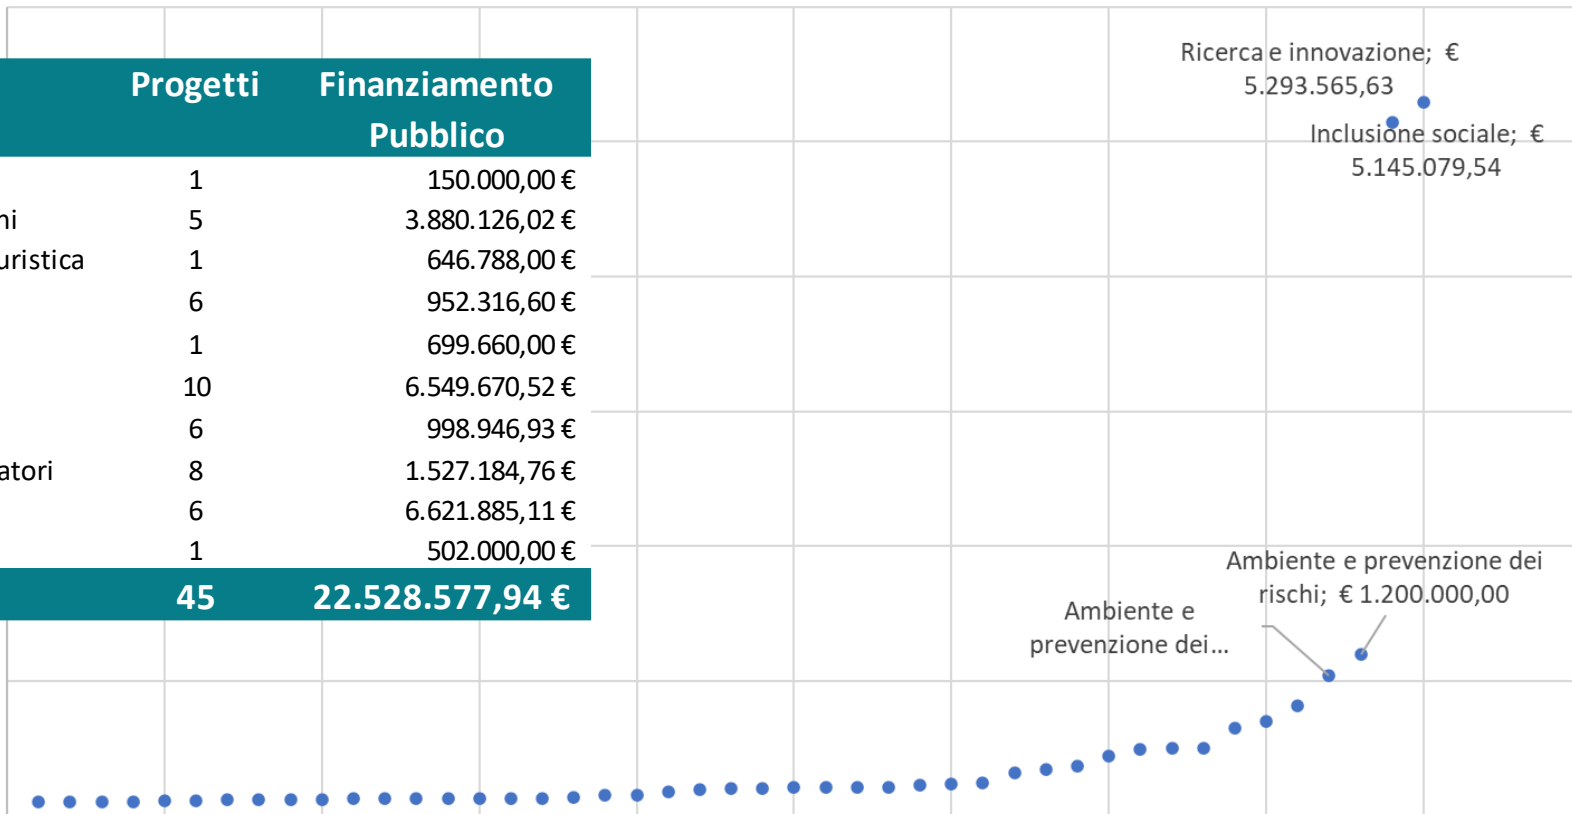


Stato procedurale dei progetti monitorati e il rispetto dei tempi ciclo di programmazione 2014-2020

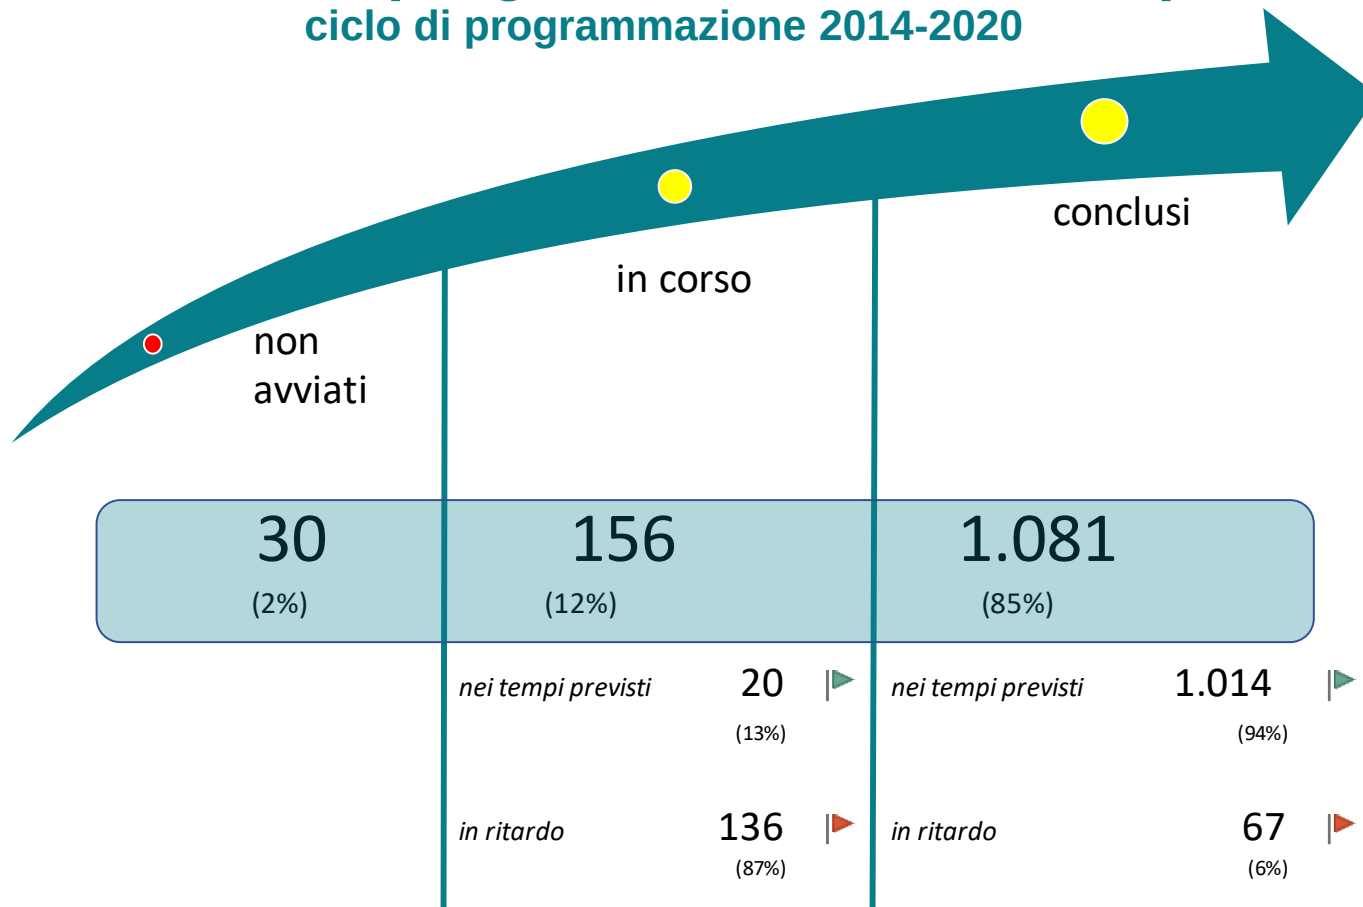

Stato del progetto

ciclo di programmazione 2014-2020

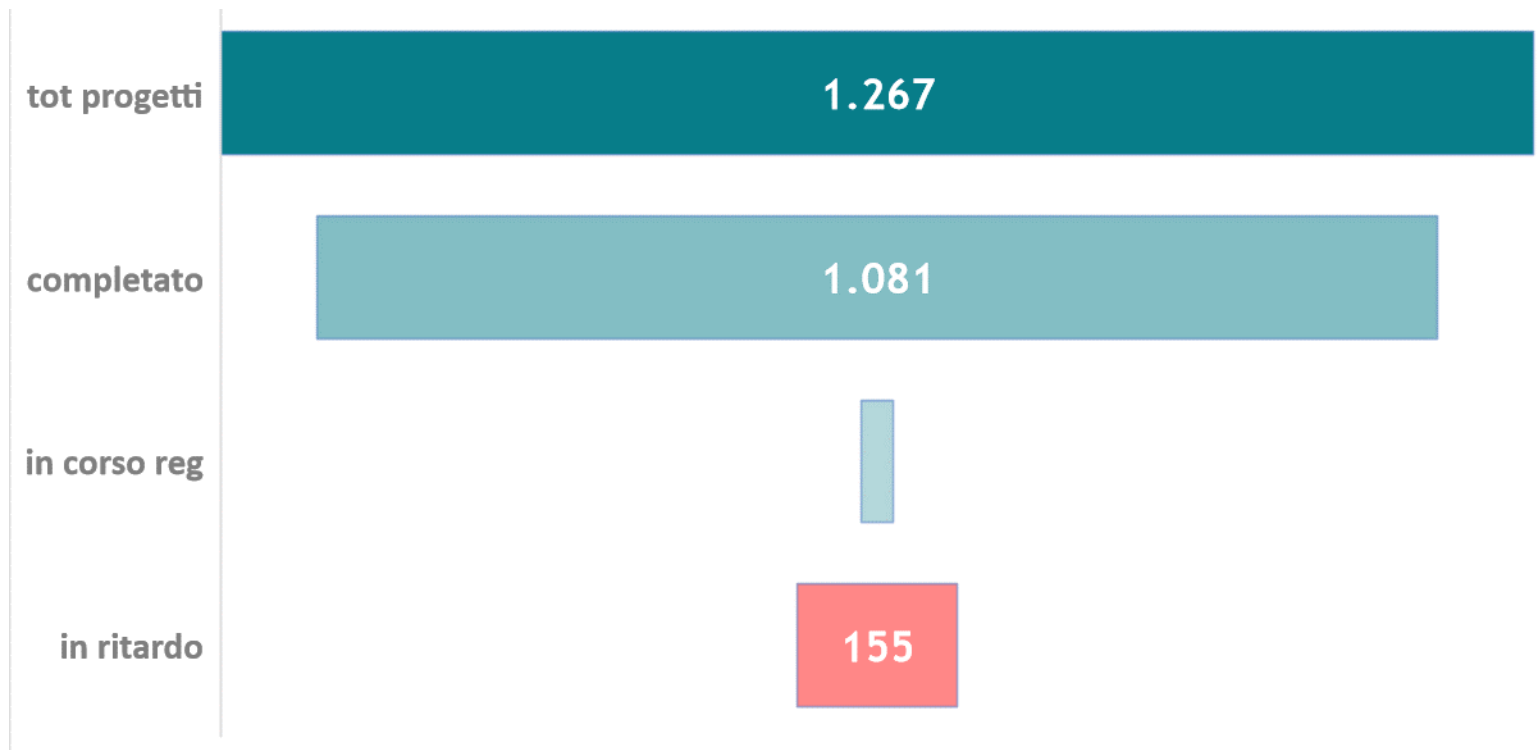


Rispetto dei tempi ciclo di programmazione 2014-2020



Stato procedurale		Rispetto dei tempi			DIMENSIONE	DURATA media EFFETTIVA (gg)	DURATA media PREVISTA (gg)
Concluso	1.081 (85%)	in ritardo	67	(6%)	grandi 12 (18%)	413,25 >	286,17
					medi 36 (54%)	191,81 >	156,39
					piccoli 12 (18%)	91,08 >	88,67
					micro 7 (10%)	156,71 >	33,86
	nei tempi previsti	1.014	(94%)		grandi 8 (1%)	487,50 <	522,50
					medi 21 (2%)	147,38 <	291,86
					piccoli 17 (2%)	131,12 <	277,41
					micro 968 (95%)	164,89 <	185,13
in corso	156 (12%)	in ritardo	136	(87%)	grandi 10 (7%)		469,80
					medi 16 (12%)		484,75
					piccoli 16 (12%)		832,06
					micro 94 (69%)		941,07
	nei tempi previsti	20	(13%)		grandi 7 (35%)		672,71
					medi 11 (55%)		702,18
					piccoli 1 (5%)		863,00
					micro 1 (5%)		1.094,00
Non avviato	30 (2%)		30		30		423,60
Totale progetti monitorati		1.267					

Durata media prevista dei Progetti

Durata media dei progetti
(gg previsti per l'esecuzione)

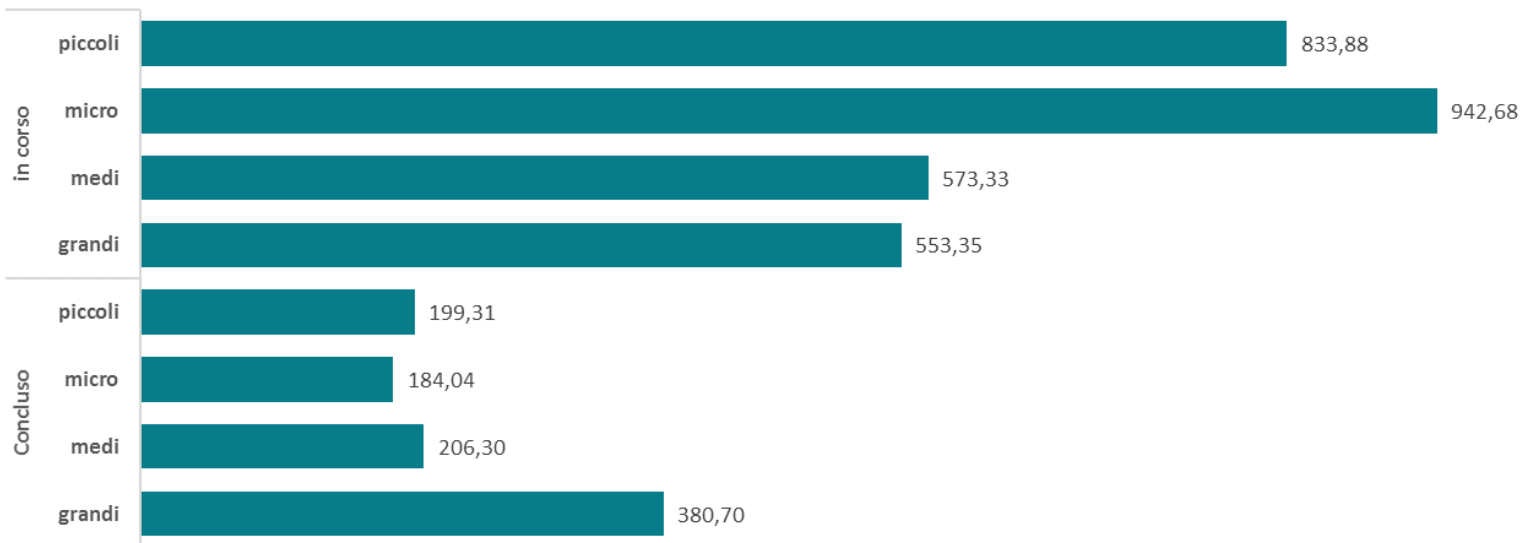

Progetti completati per dimensione durata media effettiva e prevista

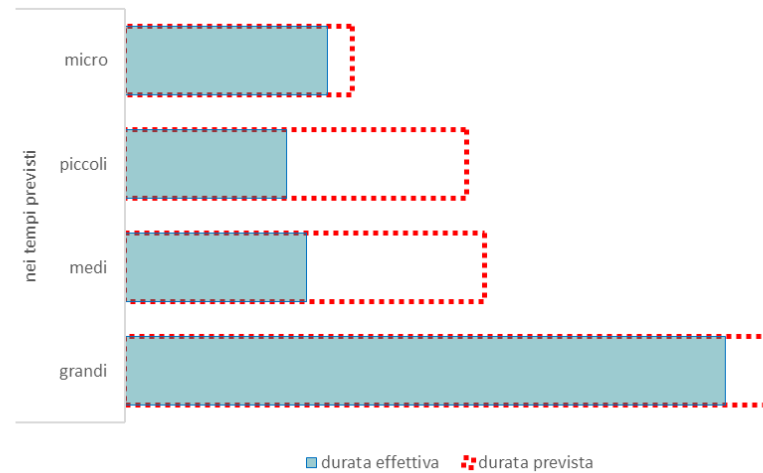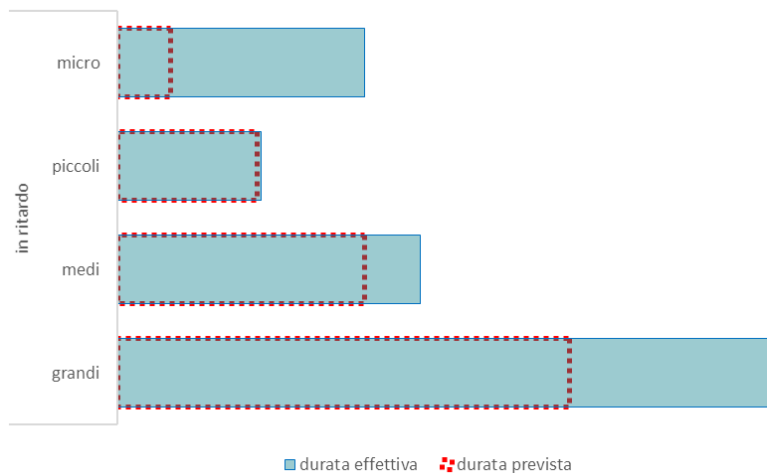


I progetti monitorati nel resto della provincia ciclo di programmazione 2014-2020

AMBITO	progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	Importo totale	valore medio
Agenda digitale	44	2%	877.124,41 €	19.934,65 €
Ambiente e prevenzione dei rischi	25	1%	19.999.199,35 €	799.967,97 €
Attrazione culturale, naturale e turistica	11	1%	3.520.421,90 €	320.038,35 €
Competitività per le imprese	131	7%	1.621.210,88 €	12.375,66 €
Energia e efficienza energetica	36	2%	2.949.165,33 €	81.921,26 €
Inclusione sociale	47	3%	2.676.864,45 €	56.954,56 €
Istruzione	86	5%	2.640.416,00 €	30.702,51 €
Occupazione e mobilità dei lavoratori	1.244	68%	4.566.178,28 €	3.670,56 €
Rafforzamento capacità della PA	61	3%	764.399,60 €	12.531,14 €
Ricerca e innovazione	120	7%	1.424.427,30 €	11.870,23 €
Trasporti e infrastrutture a rete	16	1%	6.792.801,00 €	424.550,06 €
Totale complessivo	1.821	100%	47.832.208,50 €	26.267,00 €

Stato procedurale dei progetti monitorati nel resto della provincia

ciclo di programmazione 2014-2020

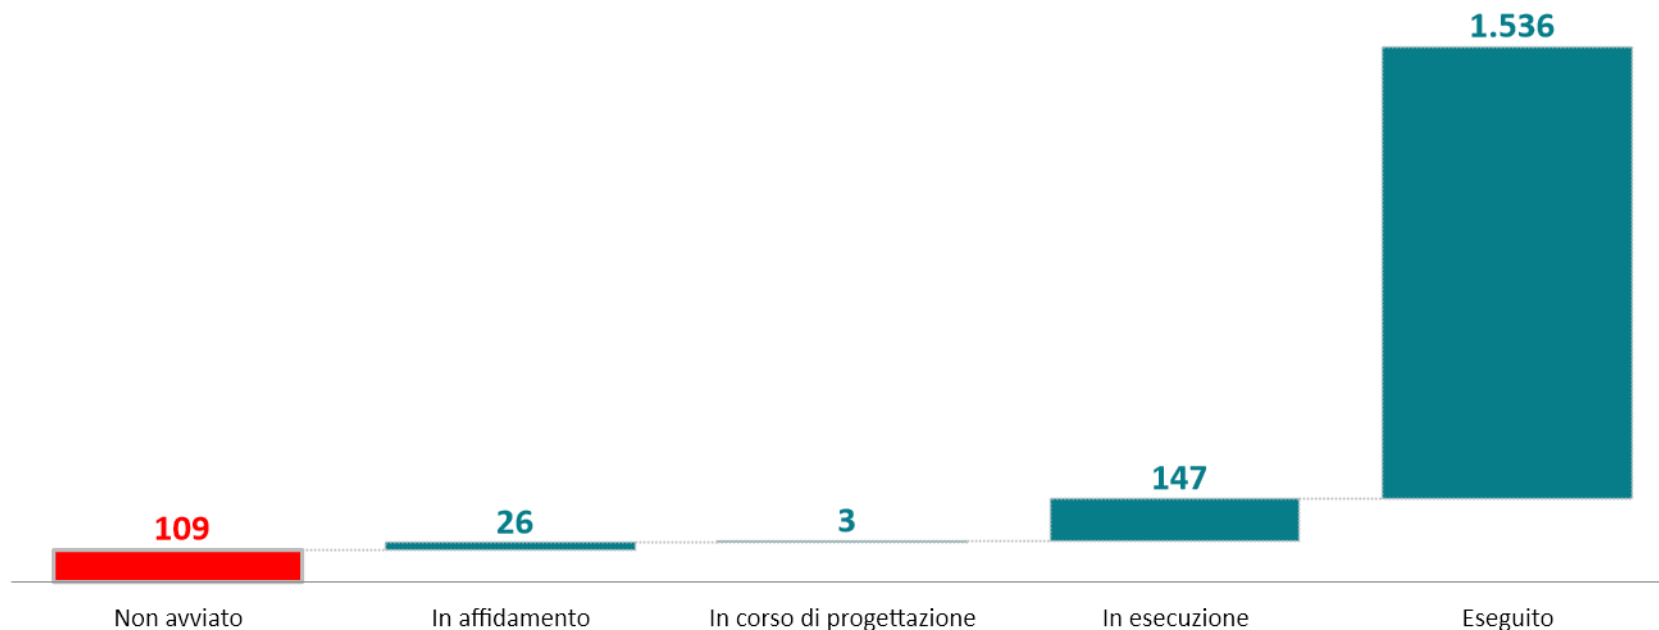

I progetti monitorati nel resto della provincia ciclo di programmazione 2014-2020

Comune	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	totale	medio
CITTADUCALE	141	7,7%	3.494.349,67 €	24.782,62 €
POGGIO MIRTETO	198	10,9%	3.272.448,28 €	16.527,52 €
FARA IN SABINA	159	8,7%	2.320.882,23 €	14.596,74 €
PESCOROCCHIANO	40	2,2%	2.276.358,00 €	56.908,95 €
POGGIO BUSTONE	27	1,5%	2.136.900,00 €	79.144,44 €
LEONESSA	29	1,6%	2.021.264,45 €	69.698,77 €
POGGIO MOIANO	78	4,3%	1.676.778,79 €	21.497,16 €
MONTELEONE SABINO	12	0,7%	1.330.637,45 €	110.886,45 €
GRECCIO	18	1,0%	1.297.900,00 €	72.105,56 €
COLLEGIOVE	4	0,2%	1.278.780,72 €	319.695,18 €
MAGLIANO SABINA	72	4,0%	1.261.772,91 €	17.524,62 €
MICIGLIANO	6	0,3%	1.225.268,00 €	204.211,33 €
TARANO	17	0,9%	1.212.057,44 €	71.297,50 €
FORANO	60	3,3%	1.168.615,42 €	19.476,92 €
MONTASOLA	10	0,5%	1.116.320,00 €	111.632,00 €
VARCO SABINO	4	0,2%	1.087.819,82 €	271.954,96 €
PETRELLA SALTO	10	0,5%	995.675,48 €	99.567,55 €
COLLALTO SABINO	4	0,2%	933.352,74 €	233.338,19 €
POSTA	41	2,3%	849.080,24 €	20.709,27 €
NESPOLO	2	0,1%	764.100,84 €	382.050,42 €
TURANIA	5	0,3%	693.442,89 €	138.688,58 €
ORVINIO	5	0,3%	607.203,13 €	121.440,63 €
POGGIO CATINO	12	0,7%	575.200,00 €	47.933,33 €
RIVODUTRI	21	1,2%	484.151,05 €	23.054,81 €

Comune	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	totale	medio
CONTIGLIANO	49	2,7%	436.866,47 €	8.915,64 €
MONTOPODI DI SABINA	79	4,3%	430.333,61 €	5.447,26 €
STIMIGLIANO	32	1,8%	380.722,00 €	11.897,56 €
BELMONTE IN SABINA	9	0,5%	331.683,70 €	36.853,74 €
ASCREA	5	0,3%	66.283,70 €	13.256,74 €
FRASSO SABINO	5	0,3%	65.650,00 €	13.130,00 €
CASTEL SANT'ANGELO	5	0,3%	63.800,00 €	12.760,00 €
CONFIGNI	3	0,2%	60.500,00 €	20.166,67 €
CONCERVIANO	3	0,2%	59.300,00 €	19.766,67 €
MORRO REATINO	2	0,1%	57.500,00 €	28.750,00 €
LONGONE SABINO	2	0,1%	56.661,20 €	28.330,60 €
TOFFIA	4	0,2%	54.683,70 €	13.670,93 €
AMATRICE	24	1,3%	324.650,94 €	13.527,12 €
CASPERIA	54	3,0%	321.518,80 €	5.954,05 €
ANTRODOCO	70	3,8%	308.301,93 €	4.404,31 €
BORGOROSE	49	2,7%	284.719,81 €	5.810,61 €
BORBONA	33	1,8%	280.284,46 €	8.493,47 €
POGGIO SAN LORENZO	6	0,3%	261.630,00 €	43.605,00 €
ROCCA SINIBALDA	11	0,6%	220.300,62 €	20.027,33 €
POGGIO NATIVO	48	2,6%	185.119,12 €	3.856,65 €
TORRI IN SABINA	41	2,3%	179.323,53 €	4.373,74 €
CANTALICE	21	1,2%	175.571,58 €	8.360,55 €
CITTAREALE	12	0,7%	139.575,60 €	11.631,30 €
FIAMIGNANO	35	1,9%	137.037,00 €	3.915,34 €

Comune	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	totale	medio
MONTEBUONO	7	0,4%	129.376,87 €	18.482,41 €
CANTALUPO IN SABINA	29	1,6%	124.600,00 €	4.296,55 €
TORRICELLA IN SABINA	8	0,4%	113.199,00 €	14.149,88 €
BORGO VELINO	36	2,0%	106.656,00 €	2.962,67 €
COLLEVECCHIO	8	0,4%	98.995,00 €	12.374,38 €
SCANDRIGLIA	11	0,6%	92.415,00 €	8.401,36 €
SELCI	18	1,0%	90.600,00 €	5.033,33 €
ROCCANTICA	14	0,8%	85.700,00 €	6.121,43 €
SALISANO	12	0,7%	85.142,00 €	7.095,17 €
MARCESELLI	4	0,2%	84.458,22 €	21.114,56 €
COTTANELLO	5	0,3%	81.029,89 €	16.205,98 €
CASAPROTA	10	0,5%	74.812,00 €	7.481,20 €
CASTEL DI TORA	8	0,4%	73.700,00 €	9.212,50 €
COLLE DI TORA	12	0,7%	71.846,40 €	5.987,20 €
VACONE	7	0,4%	68.992,00 €	9.856,00 €
CASTELNUOVO DI FARFA	9	0,5%	67.050,00 €	7.450,00 €
PAGANICO SABINO	2	0,1%	53.000,00 €	26.500,00 €
MONTENERO SABINO	2	0,1%	52.500,00 €	26.250,00 €
POZZAGLIA SABINA	1	0,1%	50.000,00 €	50.000,00 €
MOMPEO	1	0,1%	50.000,00 €	50.000,00 €
MONTE SAN GIOVANNI IN	11	0,6%	35.950,00 €	3.268,18 €
ACCUMOLI	9	0,5%	24.200,00 €	2.688,89 €
LABRO	4	0,2%	12.900,00 €	3.225,00 €
Totale complessivo	1.821	100%	47.832.208,50 €	26.267,00 €

I progetti monitorati nel resto della provincia

ciclo di programmazione 2014-2020

Comuni	Progetti		Finanziamento Pubblico	
	n.	%	totale	medio
RIETI::TORRICELLA IN SABINA	1	0,1%	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €
TUTTI I COMUNI	3	0,2%	1.961.168,45 €	653.722,82 €
CITTADUCALE::RIETI	1	0,1%	500.000,00 €	500.000,00 €
FORANO::STIMIGLIANO	1	0,1%	111.472,00 €	111.472,00 €
AMATRICE::ANTRODOCO::BORBONA::CANTALICE::COLLALTO SABINO::POGGIO BUSTONE::POSTA	1	0,1%	74.570,02 €	74.570,02 €
COLLALTO SABINO::PAGANICO SABINO::ROCCA SINIBALDA	1	0,1%	21.305,72 €	21.305,72 €
BORGOROSE::RIETI	1	0,1%	21.305,72 €	21.305,72 €
CASPERIA::MONTASOLA	1	0,1%	19.807,60 €	19.807,60 €
COLLI SUL VELINO	5	0,3%	17.100,00 €	3.420,00 €
CANTALUPO IN SABINA::CASPERIA	1	0,1%	15.979,29 €	15.979,29 €

Grazie per l'attenzione
